

COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (SA)  
COMUNE DI ALBANELLA (SA)

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023)

Cronoprogramma dei lavori.

Tav. n°:

G7

DATA:

REV.:

LAVORI DI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA E RIAMMAGLIAMENTO DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (SA) E DEL COMUNE DI ALBANELLA (SA)


*Il progettista*

*UFFICIO TECNICO COMUNALE*

*Il committente*

*Visti e pareri*

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	04/04/2025	09/12/2025	250
2		Preparazione cantiere	05/04/2025	10/04/2025	5
3		Fresatura pavimentazione stradale esistente	08/04/2025	28/05/2025	50
4		Pulizia cunette	20/05/2025	04/07/2025	45
5		Posa in opera barriere di sicurezza	02/07/2025	06/08/2025	35
6		Realizzazione zanelle	25/07/2025	03/09/2025	40
7		Realizzazione opere in c.a. attraversamento	28/08/2025	27/10/2025	60
8		Pubblica illuminazione	18/09/2025	22/11/2025	65
9		Realizzazione tappetino in conglomerato bituminoso	10/10/2025	29/11/2025	50
10		Segnaletica verticale	10/11/2025	20/11/2025	10
11		Segnaletica orizzontale	21/11/2025	06/12/2025	15
12		Chiusura lavori	07/12/2025	09/12/2025	2
13					
				09/12/2025	

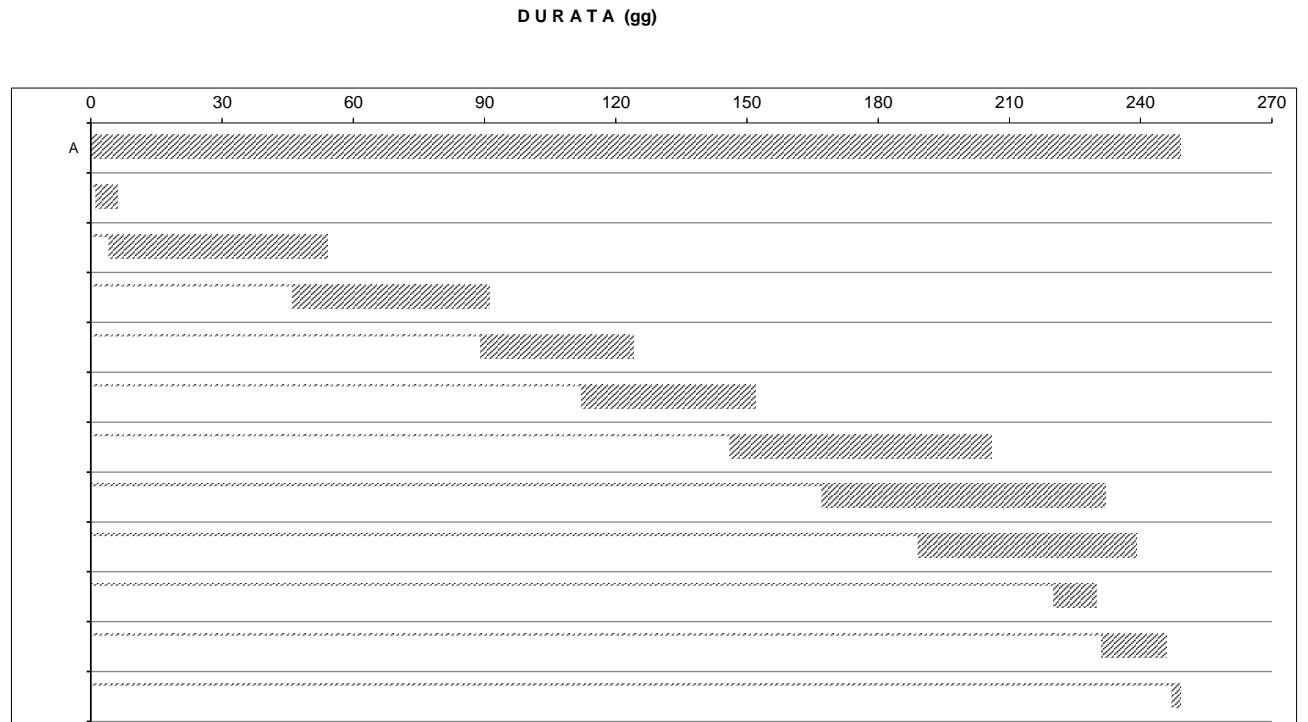

TC

**250**  
naturali consecutivi

gg.
